

Lägesrapport om genomförandet av landsbygdsprogrammet 2014–2022

Syfte med rapporteringen till övervakningskommittén

Övervakningskommittén (ÖK) ska granska programmets genomförande och framstegen när det gäller att uppnå dess mål. Lägesrapporten ger möjlighet för ledamöterna i ÖK att följa programmets genomförande hittills.

Förväntningar på ledamöterna i övervakningskommittén

Ledamöterna i ÖK förväntas ta del av innehållet i lägesrapporten för att få kännedom om programmets genomförande hittills och för att kunna bidra med förslag på vilka eventuella åtgärder som kan behöva vidtas för att uppnå måluppfyllelse. På mötet kommer underlaget att presenteras i korthet. Efter mötet förväntas ledamöterna återföra relevant kunskap till sina respektive organisationer.

Ledamöterna i ÖK kan efterfråga ytterligare underlag som behövs för att kunna följa programmets genomförande.

Bakgrund

Jordbruksverket har tagit fram en lägesrapport för genomförandet av landsbygdsprogrammet, som bland annat visar besluts- och utbetalningsläget den **1 april 2024**. Avsikten med lägesrapporten är att skapa en ögonblicksbild över genomförandet. Ambitionen är att lägesrapporten ska vara lättöverskådlig och möjlig att förstå även för den som inte aktivt arbetar med programmet.



Innehåll

Lägesrapport om genomförandet av landsbygdsprogrammet 2014–2022	1
Genomförande av landsbygdsprogrammet	3
Indikation på icke utnyttjad budget	3
Programavslut	5
Handläggningstider och behövd utbetalningstakt för projekt- och företagsstöd.....	6
Resultat.....	9
Projekt- och företagsstöd	9
Areal- och djurbaserade ersättningar	10
Bilaga 1	11
Bilaga 2	11
Bilaga 3	12
Bilaga 4	12
Bilaga 5	13



Genomförande av landsbygdsprogrammet

Budgeten är 48 143 miljoner kronor, varav den EU-finansierade delen är 23 859 miljoner kronor. Valutakursen vid omräkning av unionsbidraget är 10 kronor/euro.

När det gäller **nyttjandet av EU:s tilldelning** har de två höjningar av programmets växelkurs som gjorts under programperioden liksom anpassningar av EU:s finansieringsandelar hjälpt till att hålla nyttjandegraden uppe.

I tabellen nedan redovisas **beviljat och utbetalt stöd** för programmet i sin helhet inklusive kvarvarande åtaganden för vallodling och restaurering av betesmarker och slätterängar. I bilagorna 1 – 3 framgår hur budgetutnyttjandet ser ut per åtgärd samt per myndighet.

Budgetutnyttjande och utbetalningsnivå totalt för landsbygdsprogrammet är hög och uppgår till 98 % respektive 92 %. Nyttjandegraden bedöms bli något lägre nu än vad som redovisades i höstens lägesrapport. Detta beror främst på att många av de ansökningar om projekt- och investeringsstöd som då inte var handlagda inte har beviljats.

Tabell 1 Budgetutnyttjandet av landsbygdsprogrammet 2014–2022, tkr.

Stödform	Program-budget	Beviljat stöd, inkl. återflöden	Beviljat stöd, %	Utbetalt stöd, exklusive förskott	Utbetalt stöd, %	Indikation på icke utnyttjad budget	Indikation på andel nyttjande av program-budget, %
Landsbygdsprogrammet totalt	48 143 410	47 382 590	98%	44 374 700	92%	790 000	98%
Projekt- och företagsstöd samt Leader	16 760 041	16 414 431	98%	13 409 362	80%	650 000	96%
Areal- och djurbaserade ersättningar	29 442 760	29 287 310	99%	29 287 310	99%	140 000	100%
Tekniskt stöd	1 940 610	1 680 840	87%	1 680 840	87%	0	100%

Indikation på icke utnyttjad budget

Som det ser ut dagsläget (1 april 2024) bedömer vi att budgetutnyttjandet kommer hamna på omkring 98 procent. Av totalbudgeten 48,1 miljarder kronor kommer sannolikt cirka 790 miljoner konor inte kunna utnyttjas. Det finns flera osäkerhetsfaktorer som påverkar nyttjandegraden, exempelvis hur stort återflödet blir samt hur mycket av inneliggande ansökningar som kommer kunna beviljas och hur mycket pågående projekt kommer att utökas.

Beräkningen utgår från att:



Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden

- det finns 370 miljoner kvar av budget för projekt- och företagsstöd samt Leader¹,
- återflöden beräknas bli omkring 330 miljoner kronor,
- cirka 50 miljoner kronor ytterligare inom projekt- och företagsstöd samt Leader kommer att beviljas,
- cirka 140 miljoner kronor av budgeten för areal- och djurbaserade ersättningar kommer inte att betalas ut.

Det finns cirka 156 miljoner kvar i budgeten för **areal- och djurbaserade ersättningar** som ska användas för utbetalning av de ersättningar som fortfarande pågår men även för utbetalningar från tidigare stödår som ännu inte är färdighandlagda. En indikation är att hela den återstående budgeten för dessa ersättningar inte kommer att utnyttjas. Den visar ett överskott på drygt 140 miljoner kronor, som främst är kopplat till den minskade anslutningsgraden för vissa ersättningar, såsom ersättningar för ekologisk produktion. Under 2023 har det i huvudsak betalats ut ersättningar för vallodling och restaurering av betesmarker och slätterängar. Dessa ansökningar motsvarar cirka 29 miljoner kronor och budgeten för dessa ersättningar är cirka 45 miljoner kronor under 2023 och 2024.


Bredbandsstödet har redovisats särskilt i lägesrapporterna eftersom stödet övertecknades med 236 miljoner kronor samt att det fortfarande är många projekt som ännu inte avslutats. Det kvarstår ca 28,5 miljoner kronor att få tillbaka som återflöden från överteckningen. Det återstår att betala ut cirka 850 miljoner kronor av beviljat stöd. Bedömningen är att det kvarstående återflödet kommer att komma in och att budgeten kommer i balans.

Ett flertal projekt har fått förlängt slutdatum till kommande årsskifte eller första kvartalet 2025. Ansökan om slututbetalning ska vara inlämnad till länsstyrelserna senast 5 april 2025 så det är viktigt att följa upp att ansökningar kommer in i tid. Med undantag för länsstyrelsen i Norrbottens län så finns i dagsläget inga indikationer att länsstyrelserna inte hinner handlägga utbetalningsansökningarna i tid. Några länsstyrelser har erbjudit sig att hjälpa till med handläggningen.

För att få en mer komplett bild över budgetutnyttjande för programmet redovisar vi även **läget per grupperad handläggande myndighet**. Figur 1 nedan visar utvecklingen av utbetalningsnivån jämfört med föregående års rapportering.

¹ I beräkningen 370 miljoner kronor har hänsyn tagits att det återstår att dra in 28,5 miljoner kronor i återflöden för bredband.



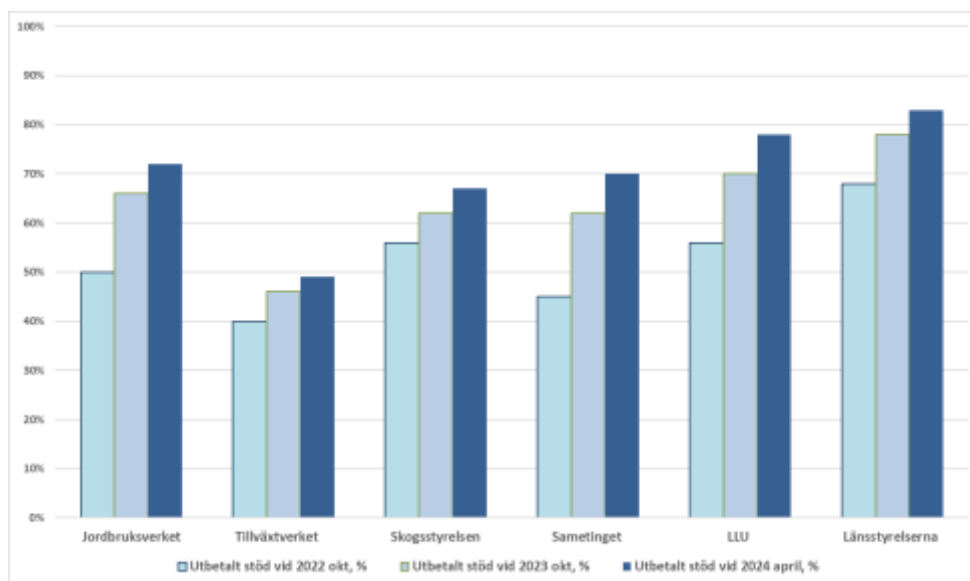

Figur 1 Utbetalningsnivån för projekt- och företagsstöd jmf med förra årets rapporteringar, uppdelat per handläggande myndighet (exkl. TA-stöd), anges i procent.

Programavslut

Den 31 december 2023 stängdes e-tjänsten för ansökan om stöd för de projekt- och investeringsstöd som varit öppna parallellt med strategiska planen för GJP. Att de kunnat vara öppna beror på att motsvarande stöd inte finns i strategiska planen.

Sista beslutsdag för nya bifallsbeslut var den 31 mars 2024 och den 30 april 2024 för förädlingsstödet. För att hantera detta i praktiken drogs myndigheternas kvarvarande budgetmedel in till Jordbruksverket. Trots indragning av budgetmedel är det fortsatt möjligt att fatta beslut om stöd i särskilda fall. Det är även möjligt att fatta beslut om att utöka budgeten eller göra andra ändringar i pågående investeringar och projekt. Myndigheterna får avropa pengar från Jordbruksverket i dessa fall.

Det är ett medvetet val att genom föreskrift inte fastställa en definitiv sista tidpunkt för beslut om stöd. Av tidigare erfarenheter vet vi att det kommer behöva göras justeringar i pågående projekt.

Den huvudsakliga orsaken till att inte bevilja nya stöd mer än i undantagsfall är att insatserna ska vara avslutade och ansökan om slututbetalning ska vara inlämnad till berörd myndighet senast den 4 april 2025. Det betyder att tiden för genomförandet är knapp. En annan orsak är att arbetet med den strategiska planen behöver prioriteras för att nå uppsatta mål i den.

Beslutet om stängning har tagits i samråd med alla berörda stödmyndigheter. Jordbruksverket har också informerat om processen i ett tidigt stadium så att myndigheterna har haft möjlighet att informera om sista dag för ansökan.



Även om det löpande förekommer ansökningar om avrop av pengar för utökning av pågående insatser så är det vår bedömning att det i praktiken inte kommer att beviljas särskilt många beslut och att de som beviljas inte kommer att ha någon större budgetpåverkan, varför budgetutnyttjandet inte kommer att öka framöver. Tvärtom kommer budgetutnyttjandet i praktiken minska allteftersom slututbetalningar görs fram tills december 2025. Orsaken är att återflöden, dvs. outnyttjade medel från beviljade stöd, kommer tillbaka till Jordbruksverket fram till dess att de sista utbetalningarna har genomförts.

Även Leader stängdes för nyansökningar den 31 december 2023. Med detta avses att ansökningarna skulle vara inkomna till Jordbruksverket. Det finns inget sista datum för bifallsbeslut. Alla ärenden som kom in till Jordbruksverket före 31 december 2023 kommer att handläggas klart. Den 1 april var det 42 ansökningar inne hos Jordbruksverket för beslut om stöd.

För **areal- och djurbaserade ersättningar** (miljöersättningar, ekologisk produktion, kompensationsstöd och djurvälstånd) är de flesta utbetalningar genomförda vid slutet av 2022, med undantag av ersättningarna för vallodling samt restaurering av betesmarker och slåtterängar som löper till och med stödår 2024.


Handläggningstider och behövd utbetalningstakt för projekt- och företagsstöd

Långa handläggningstider påverkar budgetutnyttjandet

Det har sedan tidigare funnits ett högt tryck på handläggningen och en bidragande orsak till detta är genomförda förändringar i handläggningsprocessen avseende väsentlighet och risk. Sena slutdatum på huvudärenden innebär även en risk att det blir fortsatt hög belastning när dessa kommer in med sina ansökningar om utbetalning.

Diagrammen nedan visar utvecklingen av ärendebalanser i ansökan om utbetalning från 2019 fram till och med mars 2024. Diagrammen avser samtliga handläggande stödmyndigheter och åtgärder.



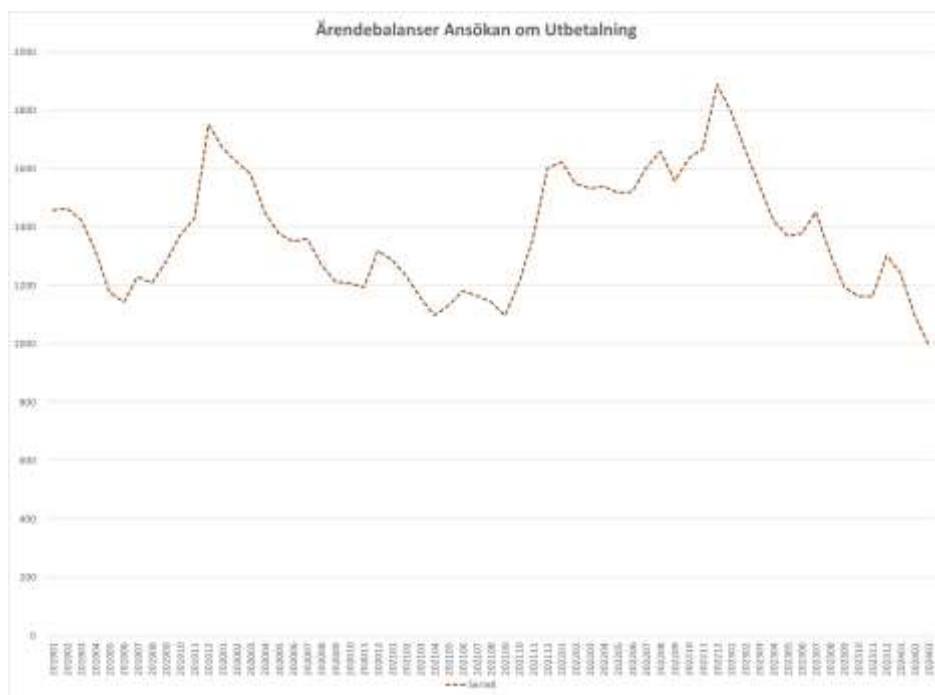

Figur 2 Antal ansökningar om utbetalning i landsbygdsprogrammet

För ansökan om utbetalning har vi sett en tydlig minskning av ärendebalanserna under senaste 1,5 åren. En särskilt kraftig minskning har setts för ärenden inom LLU som gått från 708 ärenden vid slutet av 2022 till 219 ärenden i slutet av mars 2024. Vi har även sett en klar förbättring i andelen ärenden som får ett beslut inom fyra månader från ansökan.

Inom utbetalning har ansökningstrycket inom strategisk plan ännu inte hunnit komma upp i tempo, vilket gör att mer tid kan fokuseras på gamla programperioden. Under 2023 hade även ansökningar inom regional- och socialfonden samt Havs- och fiskeriprogrammet sina sista ansökningar, där största delen varit koncentrerad till första halvåret. Dessa fonder har haft förordningsstyrda krav på 90 dagar från ansökan till beslut, vilket gjort att dessa varit prioriterade avseende handläggningsresurser.

Något som har lyfts och hanteras i samband med målstyrningsarbetet är att det kommer finnas utmaningar i att ha två program öppna parallellt för både hantering av ansökan om stöd samt utbetalning och att detta kan påverka handläggningstiderna negativt. Jordbruksverket och länsstyrelserna arbetar löpande med hur prioriteringar görs.

Behövd utbetalningstakt för åtgärder inom projekt- och företagsstöd

Tabell 2 visar den genomsnittliga utbetalningstakten per månad t.o.m. mars 2024, samt behövd genomsnittlig utbetalningstakt per månad för återstående del av programperioden.



Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden

Tabell 2 Utbetalt stöd och behövd utbetalningstakt i kronor, mnkr totalt

År	Genomsnitt per månad, mnkr
2020	212,3
2021	145,3
2022	148,0
2023	159,1
2024 (jan-mar)	136,3
Behövd utbetalningstakt t.o.m. dec. 2025	
Förväntat faktiskt utbetalat justerat för nya beslut och återflöden t.o.m. december 2025	143,6

Som framgår ovan räknar vi inte längre med fullt budgetutnyttjande varför denna redovisning justerats jämfört med tidigare år. Hela den tillgängliga budgeten kommer inte utnyttjas och återflöden som kommer tillbaka kommer inte kunna återföras till nya projekt som tidigare under programperioden.

Som framgår av tabellen ovan behöver vi ha en utbetalningstakt om cirka 143,6 miljoner kronor per månad fram till programavslutet. I detta har hänsyn tagits till att cirka 50 miljoner kronor kommer att beviljas utöver hittills beviljat stöd, samt ett uppskattat återflöde om cirka 330 miljoner kronor. Om vi håller ungefär samma utbetalningstakt som senaste åren skulle vi ha goda förutsättningar att klara av att betala ut pengarna i tid. Det finns dock ytterligare aspekter att ta hänsyn till.

För flertalet åtgärder är utbetalningstakten fortfarande lägre vad vi behöver hålla för takt för att kunna betala ut de pengar som beslutats. För att klara av att betala ut krävs att utbetalningstakten ökar. Det går särskilt trögt för projektstöden vilket sannolikt beror på att de har långa projekttider. För åtgärderna kompetensutveckling och rådgivning är en stor del av stödmottagarna myndigheter och där har vi tidigare år inte betalat ut pengar i lika hög omfattning. För kompetensutveckling har den genomsnittliga utbetalningstakten dubblerats jämfört med 2022, men är fortfarande under den behövda takten om vi ska hinna betala ut det som beviljats i stöd. Till beviljade projekt där Jordbruksverket och länsstyrelserna är stödmottagare återstår ca en halv miljard kronor att utbetala.

Även för bredbandsstödet behöver vi se en högre utbetalningstakt för att klara av betinget till december 2025.

För samarbetsåtgärden har utbetalningstakten gått upp sedan 2022, men når fortfarande inte upp till den utbetalningstakt som behövs.

För lokalt ledd utveckling märks en tydlig förbättring och vi ser goda förutsättningar att klara utbetalningsmålen om takten håller i sig.

Eftersom söktrycket förväntas öka i strategisk plan, och därmed behov av handläggningsresurser där, blir det än mer viktigt att vi håller en högre



utbetalningstakt under 2024 för att vi ska ha bättre förutsättningar att hinna betala ut resterande medel under 2025. Det finns annars en risk att balanser börjar byggas inom strategisk plan. Det förutsätter att vi får in ansökningar som kan handläggas och betalas ut i tillräcklig tid för att kunna hanteras.

Resultat

Projekt- och företagsstöd

De flesta av projekt- och företagsstöden ligger bra till i förhållande till resultatmålen. Överlag kommer flertalet av målen att nås under programperiodens sista år 2025 då de flesta redovisningarna görs vid slututbetalning.

En god måluppfyllelse över 65 %² har bland annat målen skapa nya jobb, minska utsläpp av växthusgaser och ammoniak och antal företag inom investeringsstöd till jordbruk. Några mål visar fortfarande på en låg måluppfyllelse, men det förväntade resultatet för dessa pekar mot att måluppfyllelsen ser bättre ut när projekten avslutas, exempelvis gäller det målet andel av befolkningen på landsbygden som får möjlighet att ansluta sig till bredbandsnätet (se bilaga 4).

Det finns dock mål där bedömningen är att måluppfyllelsen kommer att sluta på en låg nivå. Eftersom programperioden nästan är slut och nya stödmöjligheter till viss del finns inom den strategiska planen planeras inte några ytterligare riktade åtgärder för att få fler ansökningar inom dessa områden. Däremot är det viktigt att se till att de ärenden som beviljats också genomförs. Mål som bedöms få låg måluppfyllelse gäller antal deltagare inom stöd till kompetensutveckling samt antal insatser inom miljöinvesteringarna, både mark- och vattenrelaterade stöd. Även antal insatser för förbättrad service och infrastruktur samt natur- och kulturmiljö förväntas få låg måluppfyllelse. Det finns flera orsaker till att nämnda mål inte kommer att nås fullt ut. En viktig orsak är att målen initialt i programarbetet beräknades för högt. En annan orsak är att större och därmed färre projekt än förväntat har beviljats inom vissa stöd.

Skälen till varför målet på 135 000 deltagare är svårt att nå inom kompetensutveckling finns att läsa i Jordbruksverkets uppföljning ”Måluppfyllelse stödet till kompetensutveckling”. Projekten inom kompetensutveckling är oftast stora och de pågår under lång tid. Många projekt kommer därför inte att slutredovisas förrän i slutet av programperioden. Genomgången visar att det finns många orsaker som leder till den låga måluppfyllelsen. Bland annat handlar det om att aktiviteter inom projekten är dyrare än förväntat och att det inom vissa projekt har varit svårt att attrahera deltagare.

² Nivån baseras på jämförelse med EU-regler för resultatramen.



En undersökning som initierats under 2023, ”Stöd till kompetensutveckling i landsbygdsprogrammet 2014–2022” har tittat ännu djupare på orsakerna och vilka förbättringar som kan göras till programperioden 2023–2027. Slutsatserna visar bland annat att det har funnits aspekter i hur stödet strategiskt implementerats som sannolikt har påverkat måluppfyllelsen negativt. Det handlar om allt ifrån hur projekt valts ut och hur beslut har formulerats till en bristande kommunikation och otydlig ansvarsfördelning vid stödets uppföljning. Det finns också aspekter som är projektspecifika som har påverkat resultatet. Det handlar om att projekten har haft svårt att rekrytera deltagare, att pandemin ändrade förutsättningar för att genomföra aktiviteter och att projekten generellt är långa vilket har lett till att problematiken kring låg måluppfyllelse har uppdragats i ett sent skede. Inom kompetensutveckling genomförs även insatser där det saknas indikatormål. Det handlar i dessa fall om kunskapsutvecklings- och demonstrations- och informationsinsatser.

Vi har i tidigare lägesrapporter lyft fram att målet 660 jordbruks- och livsmedelsföretag inom samarbetsstödet för korta livsmedelskedjor inte kommer att nås. Vid närmare granskning av vad indikatorn ska mäta och vad som rapporterats in har vi funnit att hittills inrapporterade värden avsett antal samarbetspartners. Det ska vara antal företag som stötts genom samarbetsprojekten. Vi har därför gått genom ett antal av pågående projekt och tillsammans med en ny upphandling som genomförts i början av 2024, är bedömningen att det finns möjlighet att uppnå målet.

Areal- och djurbaserade ersättningar

Måluppfyllelsen för de flesta ersättningar har varit god år 2022 och det var sista året för ansökan för de flesta ersättningar förutom restaurering av betesmarker och slåtterängar och vallodling som löper till 2024. Målet för betesmarker och slåtterängar samt för fåbodar har uppnåtts fullt ut vid programavslut. Det finns dock några ersättningar som har haft sämre resultat (se bilaga 5).

Ansökningstrycket har varit lågt för **vallodling** under år 2023 och måluppfyllelsen ligger på 13% (38 317 hektar), men det är en naturlig minskning av ansökta arealer då åtaganden tar slut. Även ersättningen **restaurering av betesmarker och slåtterängar** visar en låg måluppfyllelse när det gäller målet på 10 000 hektar. Det beror på att målet avser kumulativt värde under hela programperioden medan det mäts emot årliga uppgifter om ansökt areal. Beräkningar av det kumulativa värdet är svåra att göra. En uppskattning visar att ca 8 900 hektar bör vara areal som restaureras eller har restaurerats klart, men det finns svårigheter att rensa antalet från eventuella dubletter på grund av överlåtelse under 2019–2023. Jordbruksverket bedömer att måluppfyllelsen ligger runt 70 %.



Bilaga 1

Sammanställning landsbygdsprogrammet 2014–2022, projekt- och företagsstöd, tusental kronor.
Data till och med 2024-04-01

Åtgärd kod	Åtgärd namn	Program-budget 9	Beviljat stöd, inkl. återflöden	Budget-utnyttjande, %	Återstår av budget	Utbetalt stöd, exklusive förskott	Utb. nivå, %
1	Kompetensutveckling	1 508 704	1 499 209	99%	9 495	1 043 357	69%
2	Rådgivning	563 170	549 504	98%	13 666	366 414	65%
4	Ökad konkurrenskraft inom jordbruket	3 461 608	3 390 155	98%	71 453	2 985 691	86%
4	Förädlingsstöd	209 261	185 793	89%	23 469	150 698	72%
4	Miljö-investeringar	91 047	81 249	89%	9 798	66 491	73%
6	Startstöd	208 402	202 800	97%	5 602	183 050	88%
6	Investeringsstöd för jobb och klimat	691 844	633 599	92%	58 245	567 154	82%
7	Småskalig infrastruktur	25 720	25 987	101%	-267	25 130	98%
7	Bredband ³	4 352 532	4 381 059	101%	-28 528 ⁴	3 739 729	86%
7	Service och fritid på landsbygden	759 834	752 586	99%	7 248	678 187	89%
7	Infrastruktur för rekreation och turism	210 630	217 470	103%	-6 840	106 079	50%
7	Natur- och kulturmiljö, inkl. våtmarker	613 728	569 987	93%	43 741	474 902	77%
8	Miljöåtgärder i skogen	151 297	146 950	97%	4 347	113 071	75%
10	Lantrasföreningar	33 600	31 949	95%	1 651	26 898	80%
16	EIP	533 587	521 003	98%	12 584	405 135	76%
16	Samarbete	1 020 078	952 500	93%	67 578	657 391	64%
19	Lokalt ledd utveckling	2 325 000	2 272 633	98%	52 367	1 819 988	78%
	Summa	16 760 041	16 414 431	98%	345 610	13 409 365	80%

Bilaga 2

Fördelad budget och budgetutnyttjande per grupperad handläggande myndighet, tusental kronor. Data till och med 2024-04-01

Grupperad budgetäggande organisation	Fördelad budget	Beviljat stöd, inkl. återflöden	Budget-utnyttjande, %	Utbetalt stöd, exklusive förskott	Utb. nivå, %
Jordbruksverket	2 228 035	2 168 631	97%	1 614 555	72%
Lokalt ledd utveckling	2 253 464	2 201 140	98%	1 748 496	78%
Länsstyrelserna	11 518 361	11 288 203	98%	9 554 824	83%
Sametinget	64 973	51 856	80%	45 576	70%
Skogsstyrelsen	308 477	303 480	98%	207 347	67%
Tillväxtverket	331 914	329 629	99%	164 261	49%
Avropsbudget	243 349				
Summa	16 948 573	16 342 939	96%	13 335 059	79%

³ För bredband övertecknades budgeten i december 2020 i samband med att åtgärden stängdes.

⁴ 28,5 miljoner kronor av övertecknade återstår att komma in.



Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden

Bilaga 3

Fördelad budget och budgetutnyttjande per länsstyrelse, tusental kronor. Data till och med 2024-04-01

Länsstyrelse	Fördelad budget	Beviljat stöd, inkl. återflöden	Budget-utnyttjande, %	Utbetalt stöd, exklusive förskott	Utb. nivå, %
Blekinge län	235 348	226 961	96%	183 807	78%
Dalarnas län	445 689	440 230	99%	384 038	86%
Gotlands län	201 948	195 336	97%	173 532	86%
Gävleborgs län	438 529	430 800	98%	385 838	88%
Hallands län	478 873	466 542	97%	418 537	87%
Jämtlands län	553 877	544 147	98%	477 651	86%
Jönköpings län	524 997	520 714	99%	458 030	87%
Kalmar län	652 365	631 322	97%	543 684	83%
Kronobergs län	352 742	345 352	98%	292 877	83%
Norrbottnens län	688 161	669 251	97%	468 145	68%
Skåne län	1 172 298	1 151 650	98%	969 616	83%
Stockholms län	401 290	397 954	99%	357 015	89%
Södermanlands län	405 374	395 879	98%	321 948	79%
Uppsala län	440 294	433 323	98%	358 209	81%
Värmlands län	524 277	523 516	100%	464 778	89%
Västerbottens län	598 458	589 919	99%	508 585	85%
Västernorrlands län	475 631	468 129	98%	413 040	87%
Västmanlands län	282 892	280 076	99%	226 171	80%
Västra Götalands län	1 694 602	1 638 348	97%	1 325 964	78%
Örebro län	360 624	356 504	99%	306 047	85%
Östergötlands län	590 092	582 251	99%	517 312	88%
Summa	11 518 361	11 288 203	98%	9 554 824	83%

Bilaga 4

Måluppfyllelse inom projekt- och företagsstöd, %. Data till och med 2024-04-01

Delåtgärd kod	Delåtgärd kortnamn	Fokusområde	Indikator	Omfattningsindikator	Indikatormål plan 9	Förväntat resultat för beviljade ärenden	Måluppfyllelse % Förväntat resultat	Faktiskt resultat baserat på slututbetalda ärenden	Måluppfyllelse % Faktiskt resultat
1.1	Kompetensutveckling	Alla fokusområden	O.12	Antal deltagare i utbildning	135 500	106 734	79%	25 244	19%
2.1	Rådgivning	Alla fokusområden	O.13	Antal deltagare i rådgivning	45 100	37 826	84%	7 046	16%
4.1	Investeringsstöd till jordbruk	2A	O.4	Antal företag	3 750	3 893	104%	3 350	89%
4.1	Investeringsstöd till jordbruk	5B + 5C	O.3	Antal insatser	320	243	76%	219	68%
4.1	Investeringsstöd till jordbruk	5D	O.3	Antal insatser	330	344	104%	297	90%
4.2	Förädlingsstöd	3A	O.3	Antal insatser	344	317	92%	244	71%
4.2	Förädlingsstöd	6A	O.4	Antal stödmottagare	128	135	105%	108	84%
4.2 + 6.4	Skapa nya jobb	6A	T.20	Antal nya jobb	975	1 904	195%	919	94%
4.4	Miljöinvesteringar	4C	O.3	Antal insatser	3 050	1 467	48%	1 193	39%
6.1	Startstöd	2B	O.4	Antal stödmottagare	858	822	96%	649	76%
6.4	Investeringsstöd för jobb och klimat	5C	O.3	Antal insatser	240	350	146%	335	140%
6.4	Investeringsstöd för jobb och klimat	5C	O.4	Antal stödmottagare	240	350	146%	335	140%
6.4	Investeringsstöd för jobb och klimat	6A	O.4	Antal stödmottagare	800	779	97%	653	82%
7.2	Småskalig infrastruktur	6B	O.3	Antal insatser	90	43	48%	40	44%



Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden

Delåtgärd kod	Delåtgärd kortnamn	Fokusområde	Indikator	Omfattningsindikator	Indikatormål plan 9	Förväntat resultat för beviljade ärenden	Måluppfyllelse % Förväntat resultat	Faktiskt resultat baserat på slutbetalda ärenden	Måluppfyllelse % Faktiskt resultat
7.3	Bredband	6C	O.15	Befolkning som får bredband	361 000	330 283	91%	236 626	66%
7.3	Bredband	6C	O.3	Antal insatser	650	692	106%	543	84%
7.4	Service och fritid på landsbygden	6B	O.3	Antal insatser	2 480	1 508	61%	1 379	56%
7.5	Infrastruktur för rekreation och turism	6B	O.3	Antal insatser	260	188	72%	138	53%
7.6	Natur- och kulturmiljö	6B	O.3	Antal insatser	880	519	59%	426	48%
8.5	Skogens miljövården	4C.SKOG	O.3	Antal insatser	3 000	3 012	100%	2 507	84%
16.1	Innovation jordbruk	Alla fokusområden	O.16	Antal EIP-grupper	260	250	96%	244	94%
16.2–16.9	Samarbetsåtgärder	Alla fokusområden	O.17	Antal samarbetsinsatser	470	522	111%	317	67%
16.4	Samarbeten mellan aktörer inom jordbruk samt inom livsmedelskedjan	3A	O.9	Antal jordbruksföretag som deltagit i samarbete	660	442	67%	219	33%
19.1	Förberedande stöd	6B	O.18	Antal insatser	4 261 701	4 261 701	100%	4 261 701	100%
19.2/19.3	Skapa nya jobb LLU	Alla fokusområden	T.23	Antal nya jobb	930	2 008	216%	1 176	126%

Bilaga 5

Miljö i jord- och skogsbruk, miljöersättningar, ekologisk produktion och kompensationsstöd (ansökta arealer).

Åtgärd	Åtgärd/ Delåtgärd	Mål år 2022 (hektar)	Ansökt 2022 (hektar)	Måluppfyllelse för år 2022 (%)
10	Vallodling ⁵	285 000	179 800	63%
10	Betesmarker och slätterängar ⁶	350 000	409 400	117%
10	Fäbodrar (arealer fäbodbeta)	16 200	16 800	104%
10	Restaurering av betesmarker och slätterängar ⁵	10 000	4 100	41%
10	Skötsel av våtmarker och dammar ⁷	10 900	9 500	87%
10	Minskat kväveläckage	138 000	99 300	72%
10	Skyddszoner	13 000	11 000	85%
11	Ersättning till ekologisk produktion	176 000	164 900	94%
11	Ersättning till omställning till ekologisk produktion	25 000	8 200	33%
13	Kompensationsstöd ⁸	1 467 000	1 111 100	76%

Ansökta djurenheter.

Åtgärd	Åtgärd/ Delåtgärd	Mål år 2022 (djurenheter)	Ansökt 2022 (djurenheter)	Mål-uppfyllelse för år 2022, %
14	Djurvålfärdersättningar ⁹	305 000	297 200	97%

⁵ Restaurering av betesmarker och slätterängar och vallodling löper till och med 2024. Information om nya beräknade siffror för dessa ersättningar finns under avsnittet *Resultat*

⁶ Den areal som visas för betesmarker och slätterängar är areal i åtagande, då det för denna ersättning bättre visar hur genomförandet går.

⁷ Från nuvarande programperiod finns endast statistik baserad på ansökt areal från slutbetalda ärenden. Siffran är därför osäker. Skötsel av våtmarker och dammar innehåller även areal från åtaganden från tidigare programperioder.

⁸ Målet avser total jordbruksareal inom områden där jordbrukarna kan söka kompensationsstödet. Även områden där ersättningen är noll kronor ingår i målet. Den sökta arealen motsvarar därför inte målarealen.

⁹ Statistiken visar ansökta uppgifter för år 2022 vid programavslut, vilket visar en 97-procentig måluppfyllelse.



Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden
